



Eskilstuna Energi &amp; Miljö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (5)

Sammanträdesdatum

2025-03-17

**Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB**  
**Styrelsesammanträde 2/2025**

Plats och tid	Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86 Kl. 08.30 – 12.00
Beslutande	Åsa Kullgren, ordförande Kaj Madsen, 1:e vice ordförande Seppo Vuolteenaho, 2:e vice ordförande Fredrik Anderson Kjell Dahlén Hassan Eftekhari Fredrik Elf
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Magnus Eriksson, Karin Ols, Anna-Åsa Hellström, Robert Berlin, Kent Briby, Nina Malmqvist (sekreterare)
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



## Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB Styrelsesammanträde 2/2025

### § 1 Val av justerare

Seppo Vuolteenaho utsågs av styrelsen att justera protokollet.

### § 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

---

### § 3 Föregående protokoll

Protokollet 1/2025 från föregående sammanträdet godkändes och lades till handlingarna.

---

### § 4 Tilläggsinvestering 9510583 Hattranvägen

Dnr: EEMELN.2025/21

Anna-Åsa Hellström redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB beslutade

**att** godkänna tilläggsinvestering om 4 mnkr för färdigställande av projektet Hattranvägen till en total kostnad av 33 mnkr.

#### Sammanfattning

Investeringen genomförs för att förstärka nätet till ett område som successivt förändras från sommarstugeområde till permanentboenden, samt expanderar med nya tomter. Området var tidigare ej anslutet till det kommunala VA-nätet, och en gemensam entreprenad handlades upp för förläggning av både VA-nät och kabel.

Projektet planerades färdigställas i juli 2024.

Arbetena tillhörande elnätsinvesteringen omfattar del i schakt, förläggning av 12 kV kabel, 6 nätstationer inklusive transformator samt serviser till tomtgräns och kabelskåp.

Ursprungligt investeringsbeslut för projektet fattades i mars 2022, och projektet kalkylerades då till 23,5 mnkr.

I februari 2024 prognosticeras projektet till 29 mnkr för färdigställande, och tilläggsbeslut fattas för ytterligare 5,5 mnkr.

Arbetena i fält nu färdigställda, men kostnaden har ökat ytterligare.

---



## Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB Styrelsesammanträde 2/2025

### § 5 Tilläggsinvestering 9511177 Skogstorp – Ärlavägen

Dnr: EEMELN.2025/22

Anna-Åsa Hellström redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB beslutade

- att** godkänna tilläggsinvestering om 8,5 mnkr för färdigställande av projektet Skogstorp – Ärlavägen till en total kostnad av 24,5 mnkr.

#### Sammanfattning

Projektet genomförs för att möjliggöra exploatering enligt detaljplaner för Skogstorp (Ärlavägen södra och norra sidan, samt området norr om skolan).

Arbetena omfattar rivning av befintligt 12 kV luftledningsnät samt förstärkning av nätet genom förläggning av ny 12 kV samt ny 24 kV kabel.

Ursprungligt investeringsbeslut för projektet fattades 17 mars 2022, och projektet kalkylerades då till 9,66 mnkr.

Tilläggsinvestering 6,34 mnkr fattas 14 februari 2024. Total kostnad för färdigställande prognosticerades då till 16 mnkr. Arbetena är nu klara, men den totala kostnaden har överskridit den som beslutats.

Styrelsen önskar en översyn av investeringsprocessen framöver.

---

### § 6 Anslutning av kund i Ärnaberget samt förstärkning av befintligt nät i området

Dnr: EEMELN.2025/23

Anna-Åsa Hellström redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi & Miljö Elnät beslutade

- att** tillstyrka tilläggsinvestering om 9,7 mnkr för att täcka de kostnadsökningar som uppkommit i projekt Ärnaberget 95111362 samt

- att** överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering.

#### Ärendebeskrivning

##### Projektets bakgrund och omfattning

20 september 2023 godkände styrelsen investering om 43,6 mnkr för anslutning av serverhall tillhörande Ärnabergets Fastighets AB, och i samband med detta, utföra ny- och reinvestering av befintliga kabelförband i området.


Projektet omfattar flera delprojekt:

- Anslutning av Ärnaberget Fastighets AB sker genom att en servis förläggs ifrån stationen i Vallby. Kunden betalar anslutningsavgift (32,6 mnkr) för servis och del i Vallby station.
- Förstärkning av befintligt kabelförband längs samma sträckning, och vidare fram till position för framtida station Trumpetvägen. Förstärkningen av befintligt



## Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB Styrelsesammanträde 2/2025

kabelförband sker mot bakgrund av förfrågningar från aktörer inom fordonsladdning vid Västerleden/Mått Johanssons väg, samt prognos på ytterligare effektbehov i området.

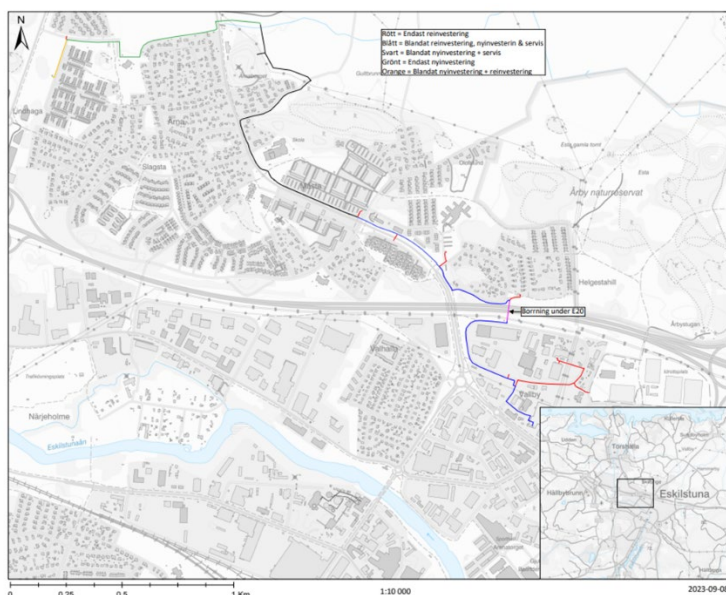

Aktuell projektstatus är att allt schaktarbete är färdigställt, samtliga kablar förlagda och ytorna återställda. Kundens anläggning spänningssattes september 2024. Återstående arbete är inkoppling av det andra kabelförbandet. Prognos för slutkostnad är 53,3 mnkr.

Följande icke budgeterade kostnadsökningar har uppkommit i projektet.

Krav från TRV på dyrare metod för borrning under E20 för att undvika påverkan på stabiliteten i vägen 500 000

Asfalteringskostnader. Ökade kostnader för asfaltering var kalkylerade baserat på erfarenhet från tidigare projekt. Hittills fakturerad kostnad överskrider dock budget + riskreservation. 2 600 000

Avvikelser i projekteringen. Avser koder som ej tagits upp i kalkylen eller mängder som överstiger det projekterade 2 900 000

Avstängningsmaterial. De krav kommunen ställt har medfört kostnader som överskrider den projekterade kostnaden 3 500 000

Återstående arbeten 200 000

Total kostnadsökning 9 700 000



Sammanträdesdatum  
2025-03-17

## **Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB** **Styrelsesammanträde 2/2025**

### **§ 7 Verksamhetsrapport**

Anna-Åsa Hellström informerade styrelsen om omvärldshändelser och aktuella aktiviteter inom elnätsverksamheten.

Medelavbrottsstatistik för årets två första månader presenterades.

---

### **§ 8 Övriga frågor**

---

